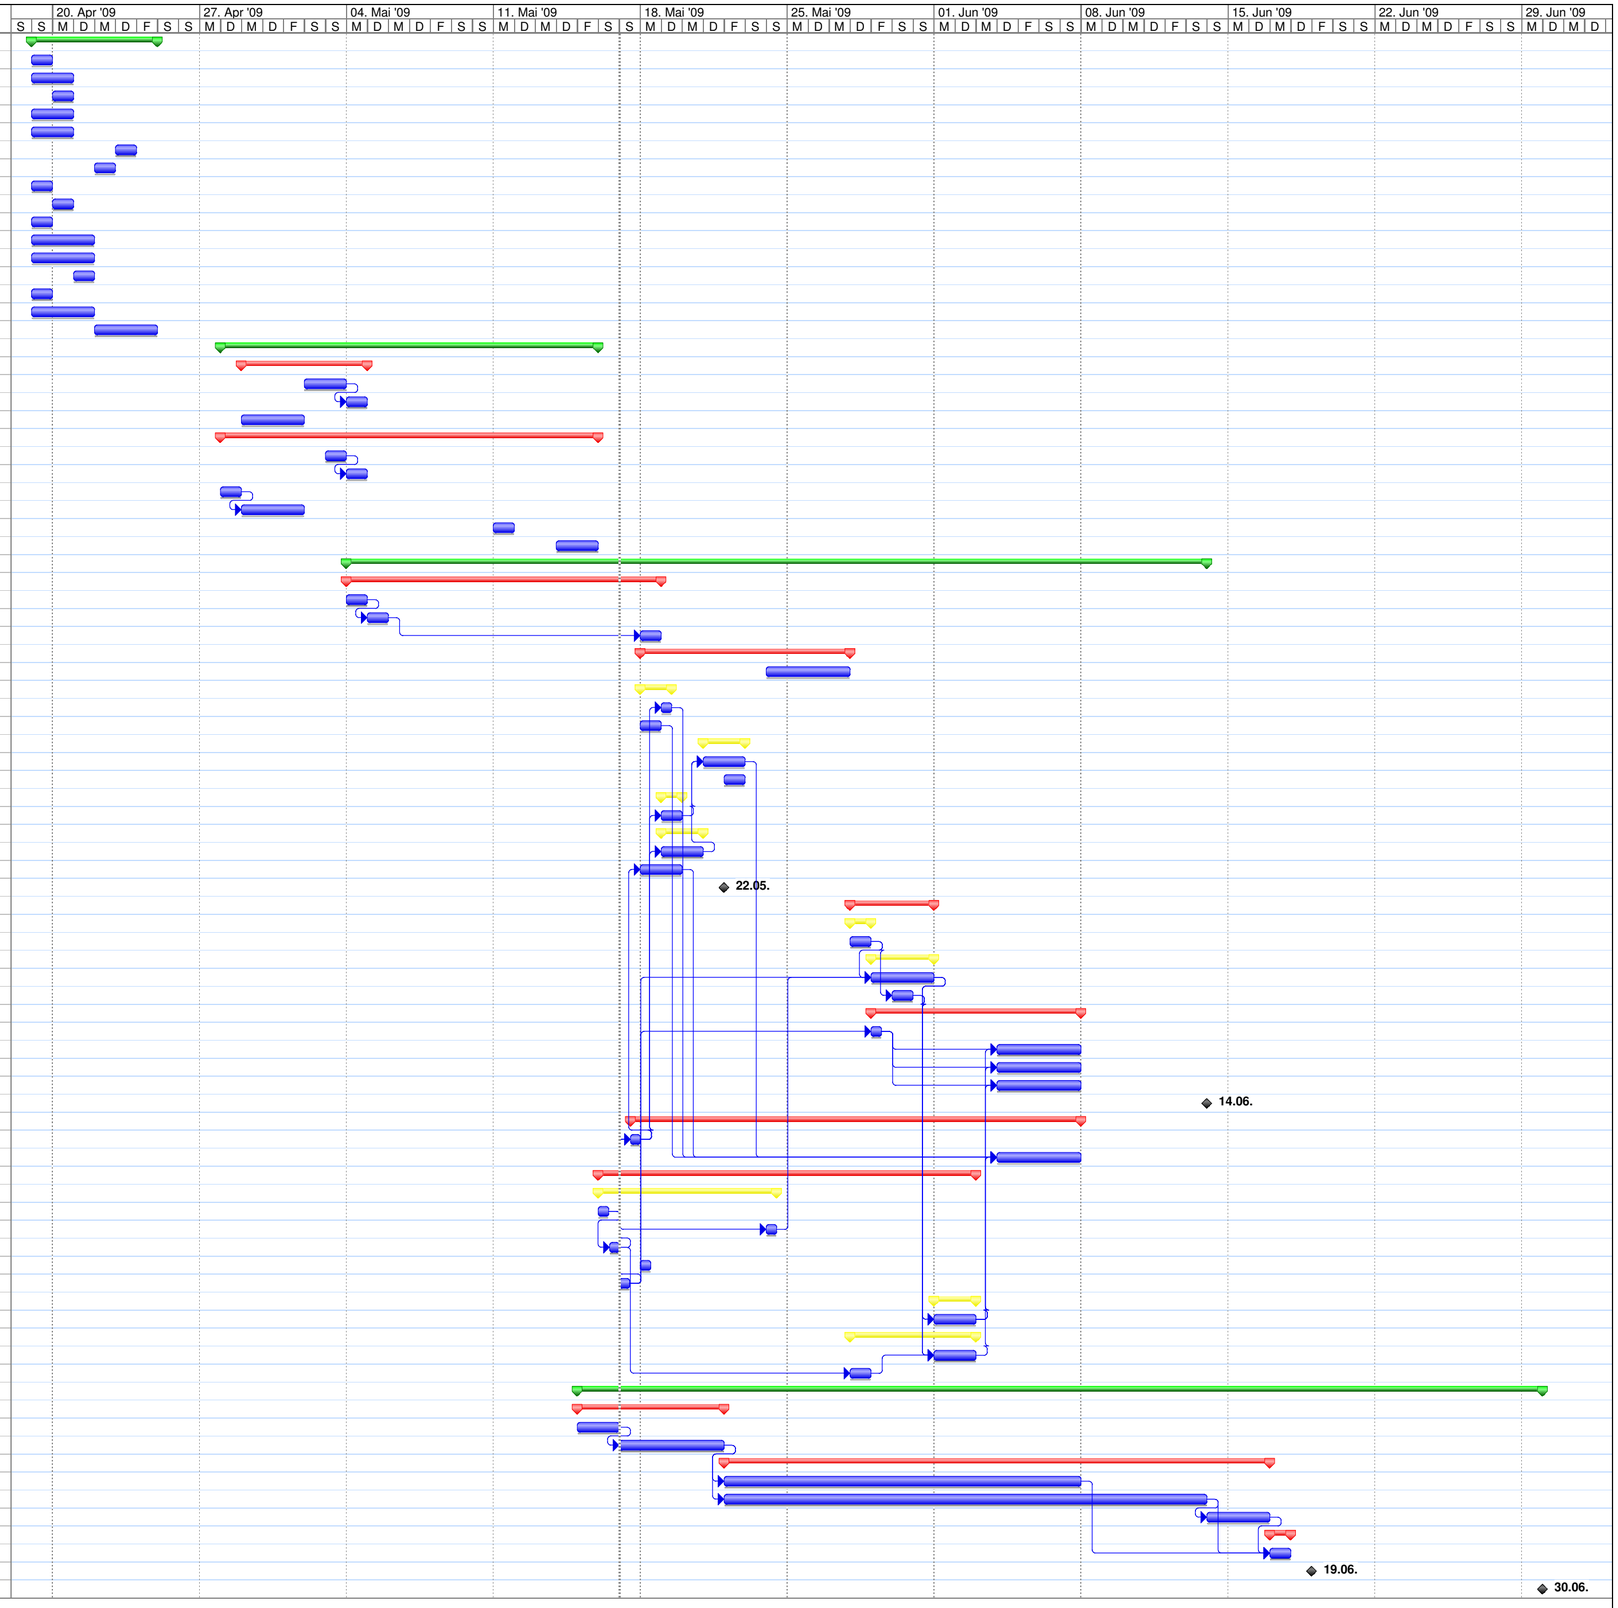Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Analyse**	**6 Tage**	**So 19.04.09**	**Fr 24.04.09**	
2	Ausgangssituation	1 Tag	So 19.04.09	So 19.04.09	
3	Projektbeschreibung	2 Tage	So 19.04.09	Mo 20.04.09	
4	Zielgruppe	1 Tag	Mo 20.04.09	Mo 20.04.09	
5	Featureliste	2 Tage	So 19.04.09	Mo 20.04.09	
6	verwendete Technologien	2 Tage	So 19.04.09	Mo 20.04.09	
7	Projektabgrenzung	1 Tag	Do 23.04.09	Do 23.04.09	
8	grober Projektplan	1 Tag	Mi 22.04.09	Mi 22.04.09	
9	Arbeitsstruktur / Rollenverteilung	1 Tag	So 19.04.09	So 19.04.09	
10	Informationswesen	1 Tag	Mo 20.04.09	Mo 20.04.09	
11	Besonderheiten	1 Tag	So 19.04.09	So 19.04.09	
12	Risikoabschätzung	3 Tage	So 19.04.09	Di 21.04.09	
13	Lieferkomponenten	3 Tage	So 19.04.09	Di 21.04.09	
14	Funktionale Anforderungen	1 Tag	Di 21.04.09	Di 21.04.09	
15	Nichtfunktionale Anforderungen	1 Tag	So 19.04.09	So 19.04.09	
16	Komponentendiagramm	3 Tage	So 19.04.09	Di 21.04.09	
17	Domänenmodell	3 Tage	Mi 22.04.09	Fr 24.04.09	
18	**Entwurf**	**18 Tage**	**Di 28.04.09**	**Fr 15.05.09**	
19	**GUI**	**6 Tage**	**Mi 29.04.09**	**Mo 04.05.09**	
20	GUI-Skizzen	2 Tage	Sa 02.05.09	So 03.05.09	
21	GUI-Beschreibungen	1 Tag	Mo 04.05.09	Mo 04.05.09	20
22	Logo-Skizzen	3 Tage	Mi 29.04.09	Fr 01.05.09	
23	**Technische Komponenten**	**18 Tage**	**Di 28.04.09**	**Fr 15.05.09**	
24	ER-Diagramm	1 Tag	So 03.05.09	So 03.05.09	
25	DB-Beschreibung	1 Tag	Mo 04.05.09	Mo 04.05.09	24
26	Anwendungsfalldiagramm	1 Tag	Di 28.04.09	Di 28.04.09	
27	Anwendungsfallbeschreibungen	3 Tage	Mi 29.04.09	Fr 01.05.09	26
28	Deployment-Diagramm	1 Tag	Mo 11.05.09	Mo 11.05.09	
29	Klassendiagramm	2 Tage	Do 14.05.09	Fr 15.05.09	
30	**Implementierung**	**41 Tage**	**Mo 04.05.09**	**So 14.06.09**	
31	**Datenbank**	**15 Tage**	**Mo 04.05.09**	**Mo 18.05.09**	
32	SQL	1 Tag	Mo 04.05.09	Mo 04.05.09	
33	Implementierung	1 Tag	Di 05.05.09	Di 05.05.09	32
34	DAO Anbindung	1 Tag	Mo 18.05.09	Mo 18.05.09	33
35	**GUI**	**10 Tage**	**Mo 18.05.09**	**Mi 27.05.09**	
36	Seitenlayout	4 Tage	So 24.05.09	Mi 27.05.09	
37	**Suche**	**1,5 Tage**	**Mo 18.05.09**	**Di 19.05.09**	
38	Klasse SearchBox	0,5 Tage	Di 19.05.09	Di 19.05.09	62
39	Klasse ResultInfoBox	1 Tag	Mo 18.05.09	Mo 18.05.09	
40	**Karte einbinden**	**2 Tage**	**Do 21.05.09**	**Fr 22.05.09**	
41	Klasse GeoMap	2 Tage	Do 21.05.09	Fr 22.05.09	44;46
42	Navigation	1 Tag	Fr 22.05.09	Fr 22.05.09	
43	**Anzeige auf Karte (Pins)**	**1 Tag**	**Di 19.05.09**	**Di 19.05.09**	
44	Klasse GeoPin	1 Tag	Di 19.05.09	Di 19.05.09	62
45	**Detailanzeige**	**2 Tage**	**Di 19.05.09**	**Mi 20.05.09**	
46	Klasse DetailView	2 Tage	Di 19.05.09	Mi 20.05.09	62
47	Klasse TagCloud	2 Tage	Mo 18.05.09	Di 19.05.09	62
48	***Meilenstein: Prototyp bzw. Alphaversion***	0 Tage	Fr 22.05.09	Fr 22.05.09	
49	**DAO**	**4 Tage**	**Do 28.05.09**	**So 31.05.09**	
50	**Datenbankverbindung**	**1 Tag**	**Do 28.05.09**	**Do 28.05.09**	
51	Klasse DBConnection	1 Tag	Do 28.05.09	Do 28.05.09	
52	**Objekt suchen/aktualisieren/einfügen**	**3 Tage**	**Fr 29.05.09**	**So 31.05.09**	
53	Klasse GeoObjectManager	3 Tage	Fr 29.05.09	So 31.05.09	51;67;70
54	Klasse ServiceManager	1 Tag	Sa 30.05.09	Sa 30.05.09	51
55	**Crawler**	**10 Tage**	**Fr 29.05.09**	**So 07.06.09**	
56	Crawler Interface	4 Std.	Fr 29.05.09	Fr 29.05.09	70
57	Klasse WikipediaCrawler	4 Tage	Do 04.06.09	So 07.06.09	56;72
58	Klasse PanoramioCrawler	4 Tage	Do 04.06.09	So 07.06.09	56;72
59	Klasse LastFMCrawler	4 Tage	Do 04.06.09	So 07.06.09	56;72
60	***Meilenstein: Betaversion***	0 Tage	So 14.06.09	So 14.06.09	
61	**Client Manager**	**21,5 Tage**	**So 17.05.09**	**So 07.06.09**	
62	Interface GeoManager	0,5 Tage	So 17.05.09	So 17.05.09	70;68
63	Klasse GeoManager	4 Tage	Do 04.06.09	So 07.06.09	38;39;41;47;74
64	**Server Management**	**18 Tage**	**Sa 16.05.09**	**Di 02.06.09**	
65	**Allgemeines**	**8,5 Tage**	**Sa 16.05.09**	**So 24.05.09**	
66	Klasse GeoObject	4 Std.	Sa 16.05.09	Sa 16.05.09	
67	Klasse DBGeoObject	4 Std.	So 24.05.09	So 24.05.09	66
68	Klasse ClientGeoObject	4 Std.	Sa 16.05.09	Sa 16.05.09	66
69	Klasse Property	4 Std.	Mo 18.05.09	Mo 18.05.09	
70	Klasse BoundingBox	4 Std.	So 17.05.09	So 17.05.09	
71	**Objekt speichern (Schnittstelle Crawler, DAO)**	**2 Tage**	**Mo 01.06.09**	**Di 02.06.09**	
72	Klasse GeoSave	2 Tage	Mo 01.06.09	Di 02.06.09	53;54
73	**Objekt suchen (Schnittstelle Client Manager, DAO)**	**6 Tage**	**Do 28.05.09**	**Di 02.06.09**	
74	Klasse GeoSearch	2 Tage	Mo 01.06.09	Di 02.06.09	53;54;75
75	Klasse SearchResult	1 Tag	Do 28.05.09	Do 28.05.09	68
76	**Test**	**46 Tage**	**Fr 15.05.09**	**Di 30.06.09**	
77	**Testplan**	**7 Tage**	**Fr 15.05.09**	**Do 21.05.09**	
78	Test entwerfen	2 Tage	Fr 15.05.09	Sa 16.05.09	
79	Test planen	5 Tage	So 17.05.09	Do 21.05.09	78
80	**Funktionale Testfälle**	**26 Tage**	**Fr 22.05.09**	**Di 16.06.09**	
81	Funktionstests	17 Tage	Fr 22.05.09	So 07.06.09	79
82	Modul Test & Mock-Test	23 Tage	Fr 22.05.09	Sa 13.06.09	79
83	System Test	3 Tage	So 14.06.09	Di 16.06.09	82
84	**Testbericht**	**1 Tag**	**Mi 17.06.09**	**Mi 17.06.09**	
85	Auswertung	1 Tag	Mi 17.06.09	Mi 17.06.09	81;82;83
86	***Meilenstein: Feinschliff und Fehlerbehebung***	0 Tage	Fr 19.06.09	Fr 19.06.09	
87	***Meilenstein: Projektabschluss***	0 Tage	Di 30.06.09	Di 30.06.09
